



**PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIĘŻBY DACHOWEJ**  
**DO PROJEKTU TYPOWEGO**  
**MINI 19 ( w. A )**

**WIĄZARY Z LITEGO DREWNA ŁĄCZONE PŁYTKAMI KOLCZASTYMI**

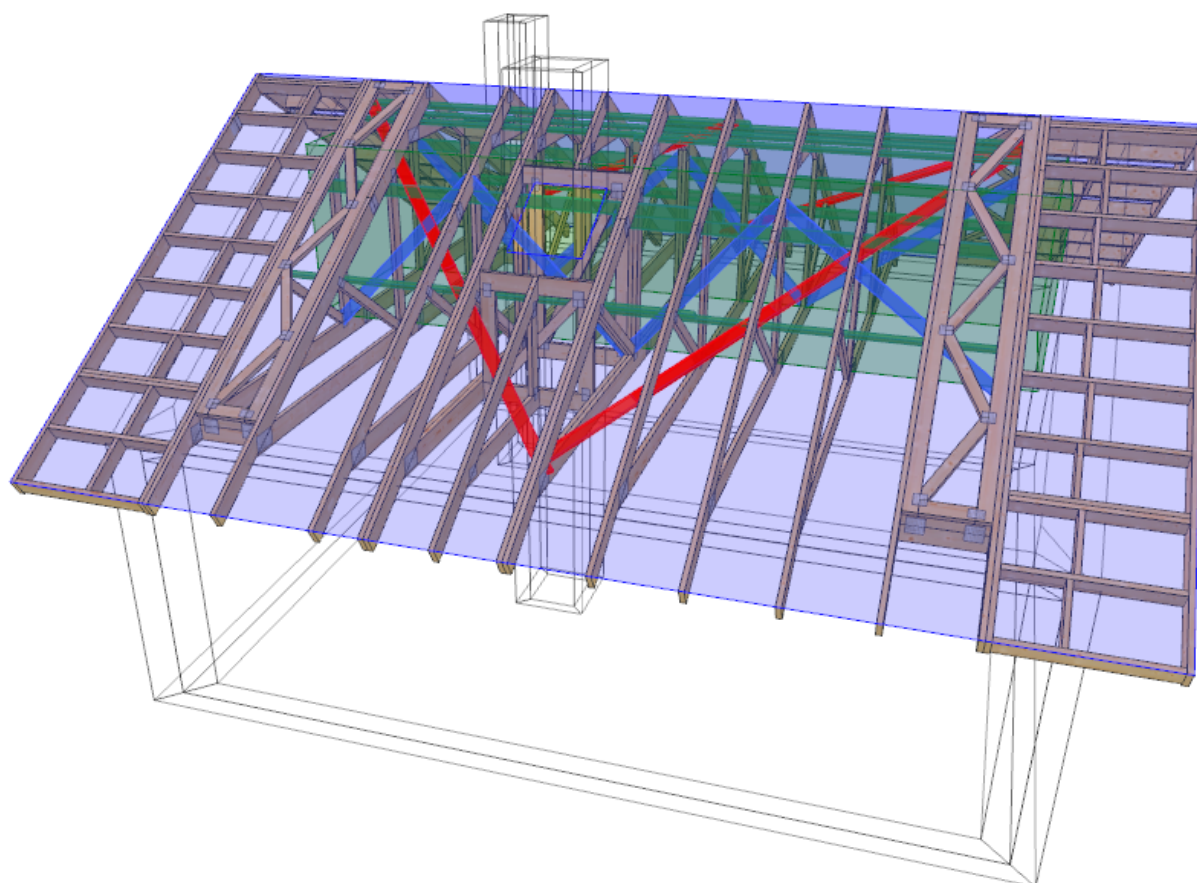

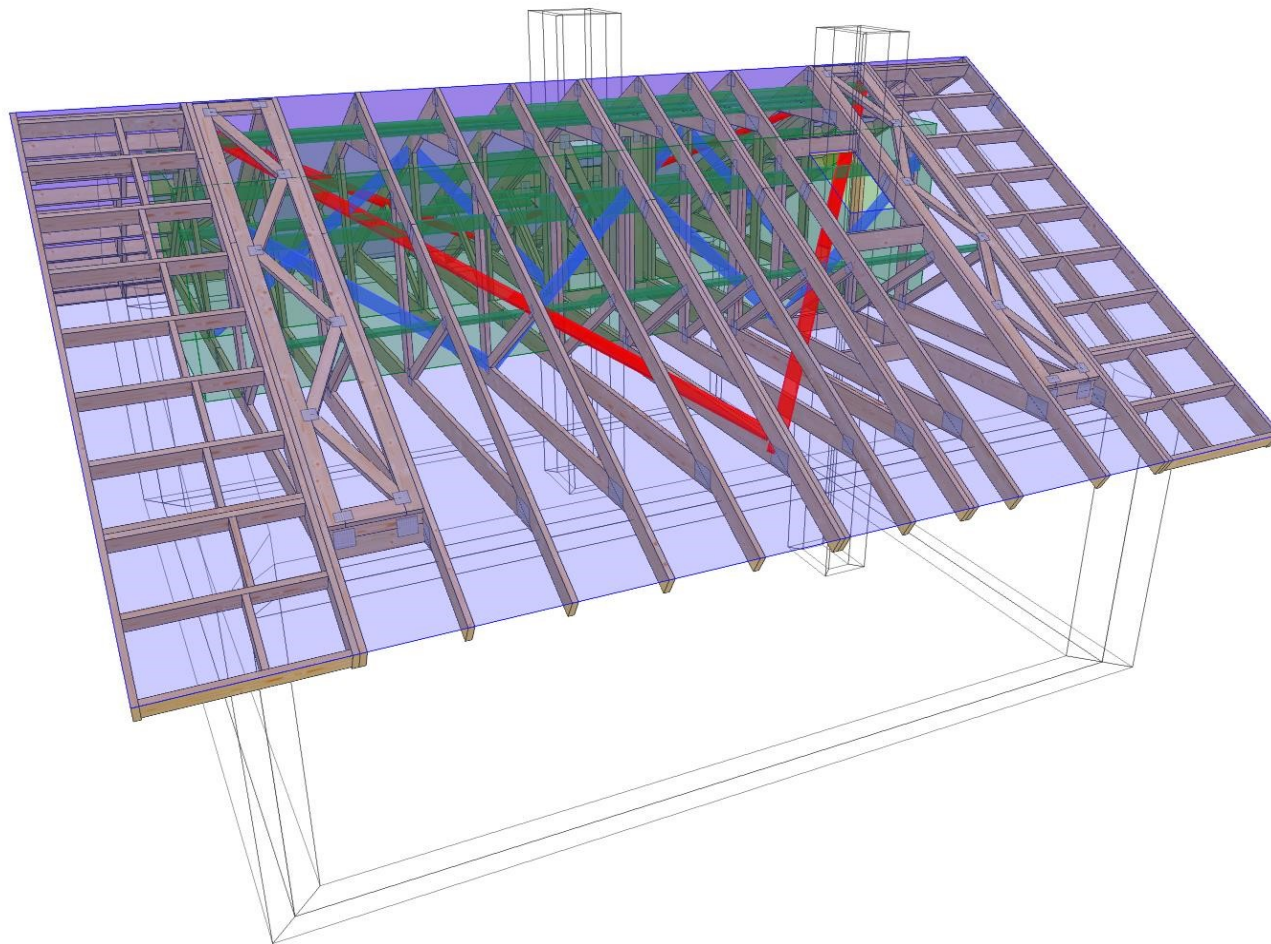

NAZWA  
OBIEKTU

Bydynek mieszkalny jednorodzinny Mini 19 ( w. A )

ADRES  
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

Widok 3D konstrukcji dachu

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Robert Marx

SKALA:

OPRACOWAŁ



mgr inż. Rafał Dudziński

DATA:


17.08.2022

SPRAWDZIŁ

NR RYS:

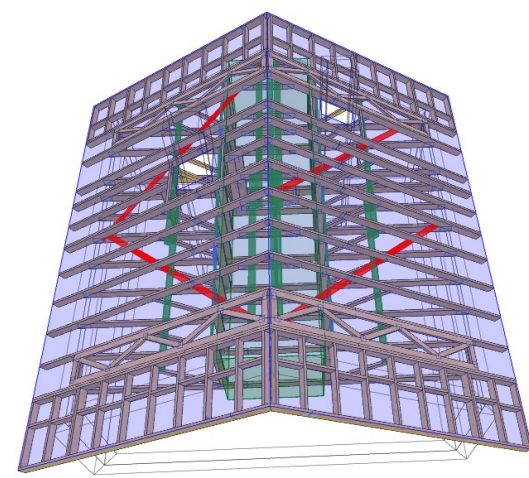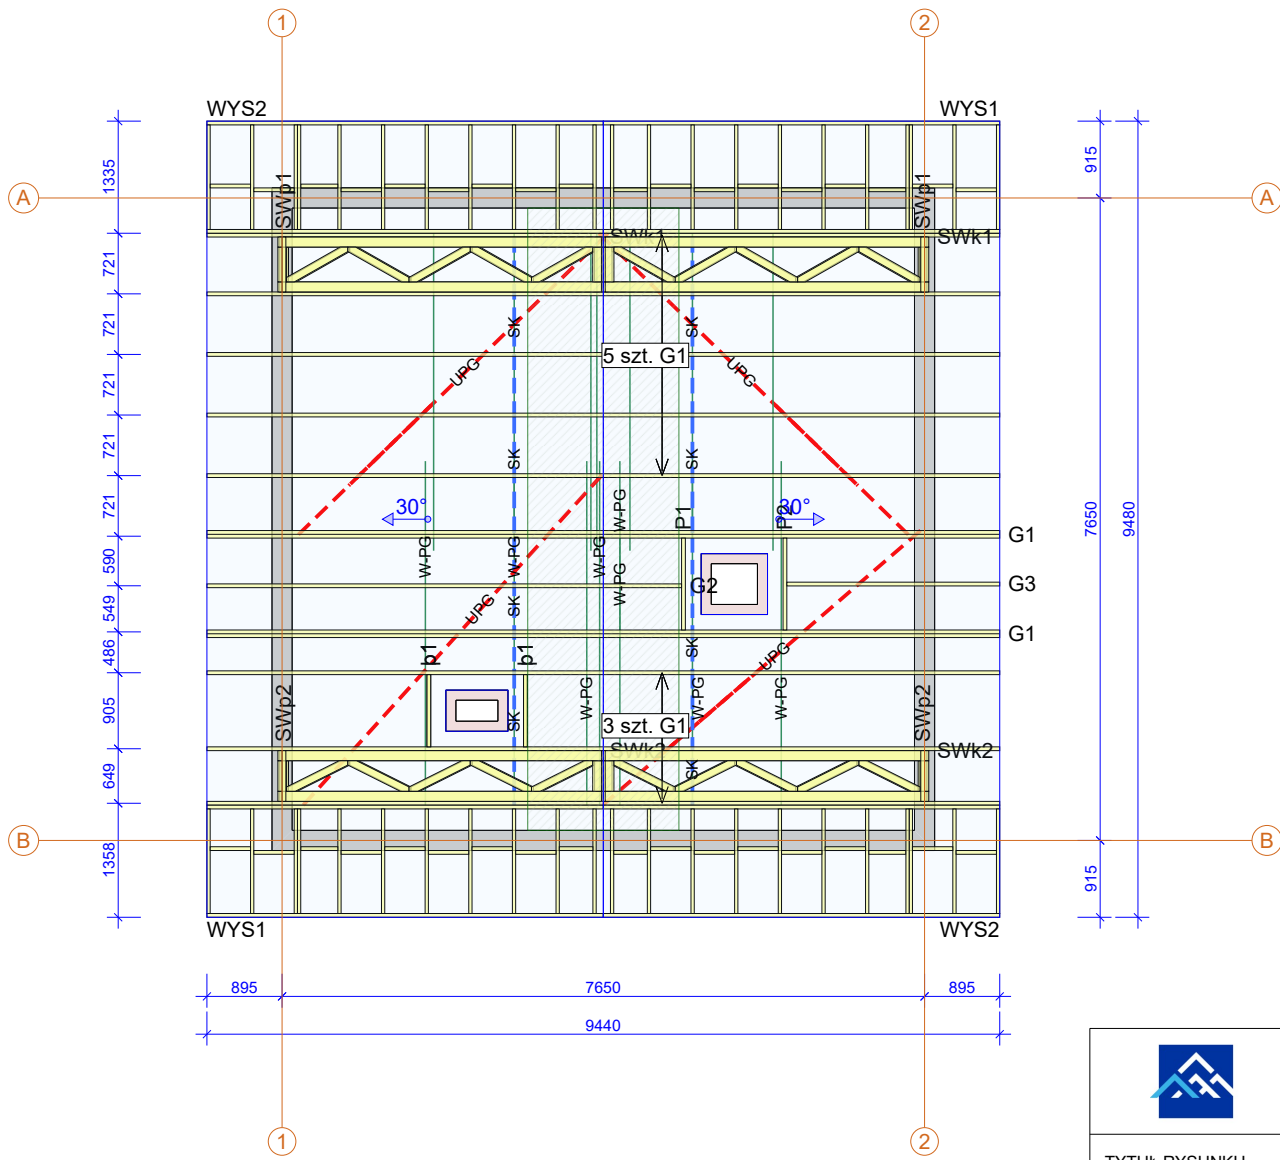

Drewno konstrukcyjne C24, gr. 45 mm  
Płytki kolczaste GNA20 oraz T150

|   |                          |   |                     |
|---|--------------------------|---|---------------------|
|  | NAZWA OBIEKTU            | Bydynek mieszkalny jednorodzinny Mini 19 ( w. A ) |                     |
|   | ADRES OBIEKTU            |   |                     |
| TYTUŁ RYSUNKU   | Rzut konstrukcji dachu   |   |                     |
| PROJEKTOWAŁ   | mgr inż. Robert Marx     |   | SKALA:<br>1:90      |
| OPRACOWAŁ   | mgr inż. Rafał Dudziński |   | DATA:<br>19.08.2022 |
| SPRAWDZIŁ   |                          |   | NR RYS:             |

## Jak zamówić wiązary prefabrykowane?

1. Zamówienie na wiązary należy złożyć w licencjonowanym zakładzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu), najlepiej w terminie od jednego do trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów.
2. Wszystkie materiały, w tym drewno, łączniki, płytki kolczaste, impregnat, zapewnia zakład prefabrykacji. Cena wiązarów obejmuje koszt wszystkich elementów.
3. Wszystkie obliczenia oparte są na parametrach łączników MiTek. Autor projektu nie wyraża zgody na zastosowanie innych płytek kolczastych.
4. Wszystkie płytki kolczaste firmy MiTek zgodnie z obowiązującą normą, są oznakowane własnym znakiem identyfikacyjnym, stale wytłoczonym na płytkach.
5. Lista autoryzowanych zakładów produkcyjnych oraz ich punktów dystrybucji znajduje się na ostatniej stronie opracowania.
6. Montaż konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.
7. Wiazary można zamówić w zakładzie prefabrykacji w dwóch wariantach:
  - a) z montażem wykonanym przez producenta,
  - b) z własnym montażem przez Zamawiającego.
8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje się w każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji.
9. Prezentację trójwymiarową konstrukcji (wizualizacja) można pobrać ze strony <https://projekty-domow-jednorodzinnych.pl/>

### INFORMACJA DLA ADAPTATORÓW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska

Tel. 76-862 89 88, e-mail: [kontakt@dachymitek.pl](mailto:kontakt@dachymitek.pl)

[www.mitek.pl](http://www.mitek.pl)

[www.dachymitek.pl](http://www.dachymitek.pl)

Informacje dotyczące wyników obliczeń, kopie projektów do pozwolenia na budowę, aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa itp.

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU PREFABRYKOWANEJ WIĘZBY DACHOWEJ

**Opis techniczny**  
**Część rysunkowa**

Rzut konstrukcji dachowej

1:100      Rys. WD1

## OPIS TECHNICZNY - PREFABRYKOWANA WIĘZBA DACHOWA

### 1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinny **Mini 19 (w. A)**. Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, stanowi projekt architektoniczno - budowlany w rozumieniu *art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami*, będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

### 2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy, normy budowlane oraz oprogramowanie inżynierskie „Pamir”.

#### 2.1. Normy i aprobaty

- PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenie śniegiem.
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wiatru.
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
- PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.
- PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek i pierścieni. Wymagania.

### 3. Ogólne dane o rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych

Główną konstrukcję dachu dwuspadowego zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wiązarów o maksymalnej rozpiętości w osi podpór 7,65 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym zgodnym z rzutem konstrukcji dachu. Wiązary oparto na wieńcu o szer. 240 mm. Zastosowano tarcicę klasy C24 o grubości 45mm. Połączenia elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów zaprojektowano na płytki kolczaste GNA20 i T150. Połączenia montażowe elementów konstrukcji dachu za pomocą stalowych łączników i okuć budowlanych dla więźb dachowych. Posadowienie wiązarów należy wykonać na poziomie wieńca +2,80 m.

#### 3.1. Odporność na korozję biologiczną i ochrona p.pożarowa

Projektowana konstrukcja zgodnie z EN 335:2013-07, powinna mieć trwałość naturalną oraz odpowiadać klasie drewna min. C24, suszonego do wilgotności 18%. Tarcicę należy zabezpieczyć środkami chroniącymi przed szkodliwym działaniem owadów, grzybów oraz ognia.

### 4. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów łączonych płytkami kolczastymi

Wiązary należy wyprodukować zgodnie z obowiązującą normą wykonawczą PN-EN 14250. Projektowane płytki kolczaste firmy Mitek Industries Polska należy wprasować w tarcicę za pomocą pras hydraulicznych, z zastosowaniem stołów montażowych w przeznaczonym do tego zakładzie prefabrykacji. Lista zakładów prefabrykujących wiązary dachowe została dołączona do niniejszego opracowania.

## 5. Montaż więzara na podporze

Połączenie kratownic z murłatą zaprojektowano za pośrednictwem kątowników ACRL10520 w ilości 2szt./węzeł. Kątowniki łączyć z dźwigarem oraz murłatą gwoździami pierścieniowymi 4.0x40. Pełne gwoździowanie.

## 6. Stężenia wzdłużne

Stężenia wzdłużne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 32x120mm. Stężenia mocować wg rysunków do wiązarów pośrednich w węzłach, gwoździami pierścieniowymi 3,2 x 80 w ilości min 2szt. Rozstaw pośredni nie powinien przekraczać 3,0m.

## 7. Stężenia ukośne

Stężenia o przekroju 32x120mm mocować do wiązarów w pasie górnym w węzłach pod kątem 45 stopni, gwoździami pierścieniowymi 3,2 x 80 w ilości min. 2szt.

## 8. Wytyczne montażu konstrukcji

- Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia.
- Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarских ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji.
- Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi należy zabezpieczyć poprzez przełożenie warstwą izolacji.
- W trakcie montażu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego należy uwzględnić (zgodnie z projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci.
- Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe ocynkowane.
- Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości.

## Uwagi końcowe

- Zmiana zaprojektowanych płytek kolczastych GNA20, T150 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 49 ust.2),
- Wiązary należy zamawiać w autoryzowanym zakładzie produkcyjnym wiązarów dachowych,
- Wiązary dachowe z płytkami kolczastymi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wilgotnej atmosfery, śniegu lub agresywnymi związkami chemicznymi, które mogą być przyczyną korozji stali. W przeciwnym razie zaleca się stosowanie płytek kolczastych ze stali nierdzewnej,
- Bezpośrednio po montażu prefabrykowanych wiązarów, należy ułożyć warstwy pokrycia dachowego,
- Obliczenia konstrukcji dachu dostosowane do warunków dla:
  - strefy śniegowej 2
  - strefy wiatrowej 1, kategoria terenu I

Opracowanie:  
mgr inż. Rafał Dudziński



**Zestawienie obciążeń dopuszczalnych dla wiązarów**

| <b>Pas górny</b> |                        | Obciążenie charakterystyczne |
|------------------|------------------------|------------------------------|
|                  |                        | [kN/m <sup>2</sup> ]         |
|                  | Panele fotowoltaiczne  | 0,150                        |
| 1.               | Dachówka ceramiczna    | 0,650                        |
| 2.               | Łaty 40x60 mm co 32cm  | 0,032                        |
| 3.               | Kontrłata 30x50 mm     | 0,010                        |
| 4.               | Folia wstępnego krycia | 0,002                        |
| <b>SUMA:</b>     |                        | <b>0,844</b>                 |

| <b>Pas dolny</b> |                       | Obciążenie charakterystyczne |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
|                  |                       | [kN/m <sup>2</sup> ]         |
| 1.               | Płyta OSB 22mm        | 0,160                        |
| 2.               | Wełna mineralna 30 cm | 0,120                        |
| 3.               | Płyta GK na ruszcie   | 0,170                        |
| <b>SUMA:</b>     |                       | <b>0,450</b>                 |

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Obciążenie użytkowe (pas dolny)</b> | <b>1,500</b> | [kN/m <sup>2</sup> ] |
|--|--------------|----------------------|

| <b>Obciążenie śniegiem</b>                 |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| Strefa obciążenia śniegiem                 | 2            |                      |
| Wysokość nad poziomem morza                | 300          | m n. p. m.           |
| Wartość charakterystyczna obciążenia $s_k$ | <b>0,900</b> | [kN/m <sup>2</sup> ] |
| Współczynnik ekspozycji $C_e$              | 1,0          |                      |
| Współczynnik termiczny $C_t$               | 1,0          |                      |

| <b>Obciążenie wiatrem</b>                               |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| Strefa obciążenia wiatrem                               | 1            |                      |
| Kategoria terenu  | 1            |                      |
| Wysokość nad poziomem morza                             | 300          | m n. p. m.           |
| Wartość podstawowa ciśnienia prędkości wiatru $q_{b,0}$ | <b>0,420</b> | [kN/m <sup>2</sup> ] |
| Wysokość budynku do kalenicy                            | 5,37         | m                    |



## Gdzie zamówić wiązary?

Autoryzowane zakłady prefabrykacji i punkty sprzedaży (wg kodów)

### AUTORYZOWANE ZAKŁADY PREFABRYKACJI:

| Nazwa firmy                          | Ulica                             | Kod    | Miasto                     | telefon        | e-mail                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| ERAGA                                | ul. Cienista 20 lok. 17           | 02-439 | Warszawa                   | 22 211 18 90   | eraga@eraga.com.pl             |
| M.G. DOMY Sp. z o.o.                 | ul. Uczniowska 13                 | 03-112 | Warszawa                   | 500-200-660    | biuro@mgdachy.pl               |
| N-DREWNO                             | Sniadówko 11A                     | 05-180 | Pomiechówek                | 783 542 565    | biuro@ndrewno.pl               |
| HATEK                                | ul. Tartaczna 71                  | 06-102 | Pułtusk                    | 23 692 77 31   | hatek@hatek.com.pl             |
| WIĄZARY CZAPLICKI                    | Chmielen Wielki 15                | 06-316 | Krzywnoługa Mała           | 509 732 996    | janusz.czapliski@op.pl         |
| LUGRO Wiązary Dachowe                | ul. Sikorskiego 116               | 07-200 | Wyszaków                   | 501 005 418    | plotr@fabryka-wiazarow.pl      |
| DOMYDACHY.PL                         | Żelków Kolonia ul. Piaskowa 27    | 08-110 | Siedlce                    | 505 027 173    | biuro@domydachy.pl             |
| Mazurskie Chałupy                    | ul. Fabryczna 13C                 | 11-040 | Dobre Miasto               | 502454572      | biuro@mazurskiechalupy.pl      |
| WIĄZARY GK                           | ul. Sztynwałdzka 14               | 13-340 | Biskupiec                  | 570 333 971    | biuro@wiazarygk.pl             |
| FH CASTOR                            | ul. Demokracji 4b                 | 14-100 | Ostróda                    | 89 642 27 00   | m.kaminski@castor.net.pl       |
| Wiazarytbi                           | ul. Asnyka 6                      | 17-100 | Bielsk Podlaski            | 515 930 019    | biuro@wiazarytbi.pl            |
| BUD-DACH                             | Kojły 21                          | 17-200 | Hajnówka                   | 85 873 23 88   | biuro@buddach.pl               |
| BST HOUSE                            | ul. Zenonów 45B                   | 26-624 | Kowala                     | 608515755      | wiazary@bsthouse.pl            |
| CONCEPT EIENDOM                      | Rudno 178                         | 32-067 | Tenczynek                  | 601 598 462    | biuro@cocncepteiendom.pl       |
| Skandach Sp. Z o.o.                  | ul. Wenecja 5                     | 34-100 | Wadowice                   | 508 730 766    | slawomir@scandach.pl           |
| F.U.H.P. CANADA SYSTEM               | ul. Leśna 66                      | 34-600 | Limanowa                   | 18 337 57 24   | biuro@canada-system.pl         |
| SAWE                                 | Niechobrz 923                     | 36-047 | Niechobrz k/ Rzeszowa      | 17 871 81 46   | wojciechsikora@sawe.pl         |
| MT SYSTEM                            | ul. Częstochowska 16              | 42-283 | Boronów                    | 602 797 327    | biuro@wiazarymt.pl             |
| Prodrew s.c.                         | Bonowice60                        | 42-445 | Szczekociny                | 661259588      | mail.biuro@prodrew.pl          |
| ALDACH                               | ul. Żarnowiecka 58                | 42-445 | Szczekociny                | 668 315 028    | kontakt@aldach.pl              |
| Moskala Domy                         | ul. Górecka 148a                  | 43-438 | Brenna                     | 601251545      | info@moskala.com.pl            |
| WIĄZAR SYSTEM                        | ul. Wolczyńska 63B                | 46-264 | Krzywiczyny                | 77 414 14 68   | kontakt@wiazar-system.pl       |
| ZIMMERMANN-HAUS                      | ul. Edmunda Strzeleckiego 4       | 47-133 | Jemielnica                 | 600558016      | konstrukcje@zimmermann-haus.pl |
| WIĄZAR PLUS                          | ul. Miłoszowska 18                | 51-502 | Wrocław                    | 884 641 414    | biuro@wiazar-plus.pl           |
| AX Projekt                           | ul. Górska 46                     | 53-610 | Wrocław                    | 510 673 510    | biuro@wiazary.wroclaw.pl       |
| TIMBER PL SPÓŁKA Z O. O.             | ul. Koberzycka 12                 | 55-040 | Wierzbice                  | 507 988 733    | biuro@timberpl.com             |
| Wiazar Skandydawia                   | ul. Ksiecja Bernarda 7            | 58-100 | Świdnica                   | 572304320      | biuro@wiazarskandydawia.pl     |
| WIĄZAR POLSKA                        | ul. Ceramiczna 4                  | 58-130 | Żarów                      | 578 211 132    | biuro@wiazarpolska.pl          |
| WESTMALL                             | ul. Kościuski 6a                  | 59-230 | Prochowice                 | 76 858 56 86   | westmall@westmall.com.pl       |
| INTER-LERS                           | ul. Czarnieckiego 8               | 62-270 | Klecko k/ Gniezna          | 61 427 04 23   | wyceny@inter-lers.pl           |
| WIĄZARY GÓRSKI                       | ul. Kijowiec 8a                   | 62-561 | Ślesin                     | 48 63 2704 387 | biuro@wiazarygorski.pl         |
| TARTAK OSTRÓW                        | ul. Topolowa 154                  | 63-400 | Ostrów Wielkopolski        | 722 369 078    | tartakostrow@o2.pl             |
| GRUPA BURKIEWICZ SP.J.               | ul. Kaliska 47                    | 63-430 | Ordolanów k/ Ostrowa Wlkp. | 62 733 83 31   | wiazary@burkiewicz.pl          |
| BLACH-DEK                            | ul. Przemysłowa 7                 | 64-200 | Wolsztyn                   | 68 384 25 21   | konstrukcje@blachdek.com.pl    |
| Zetbeer                              | Orzeszkowo 29                     | 64-420 | Kwilcz                     | 61 291 50 21   | wiazary@zetbeer.pl             |
| ZRB Lechnar                          | ul. Słowackiego 20                | 64-761 | Łokacz Mały                | 667 697 663    | biuro@lechnar.pl               |
| WIĄZARY LISIEWICZ                    | ul. Rozwojowa 14                  | 66-100 | Sulechów                   | 502 080 236    | konstrukcje@lisiewicz.com.pl   |
| WIĄZARY LEWANDOWSKI                  | Świerkocin 30                     | 66-460 | Witnica                    | 95 752 17 58   | biuro@wiazary-lewandowski.pl   |
| KONSTRUKCYJNY.PL                     | ul. Kolejowa 1                    | 67-400 | Wschowa                    | 600 332 985    | biuro@konstrukcyjny.pl         |
| PARTNER                              | ul. Przyszłości 20                | 70-893 | Szczecin                   | 91 462 17 20   | info@partner.szczecin.pl       |
| KUDRA I SPÓŁKA                       | ul. Lubieszyska 6                 | 72-006 | Mierzyn k/ Szczecina       | 91 311 50 32   | biuro@kudra.com.pl             |
| JONDA Konstrukcje Sp. z o.o.         | ul. Wielecka 21B                  | 72-006 | Mierzyn k/ Szczecina       | 91 483 42 41   | kontakt@jonda-konstrukcje.pl   |
| Tartak ROGOZIŃNA                     | Rogozina7B                        | 72-350 | Niechorze                  | 604 147 557    | info@tartakrogozina.pl         |
| Tartak Bonin Usługi i Handel Drewnem | Bonin 13                          | 73-200 | Choszczno                  | 95 766 19 15   | akbonin@onet.eu                |
| DACHY SKOWROŃSKI                     | ul. Dargomyśka 2                  | 74-400 | Dębno                      | 697660410      | wiazary@solidnydach.pl         |
| Wascovilla                           | Stary Kraków 36/Kanin 17A         | 76-100 | Stawno k/ Koszalina        | 59 810 82 99   | biuro@wascovilla.pl            |
| Wood-House Paweł Weznerowicz         | ul. Piawieńska 11c                | 78-550 | Czaplinek                  | 502 165 998    | biuro@wood-house.net.pl        |
| PPHU ROMAR                           | ul. Kolejowa 25A                  | 78-630 | Człopa                     | 67 259 18 22   | info@pphu-romar.pl             |
| Tartak Ligora                        | ul. Cisowa 5                      | 82-300 | Elbląg                     | 530 828 168    | biuro@tartak-ligora.pl         |
| COMPLEX                              | ul. Szeroka 4                     | 83-330 | Borkowo k/ Gdańsk          | 58 685 88 00   | borkowo@complex.gda.pl         |
| Stolarka Sp. z o.o.                  | Mojusz 68                         | 83-334 | Miechucino                 | 881 035 350    | biuro@eurowiazary.pl           |
| ZHUP ZDRAMET                         | ul. Zdrada 8A                     | 84-100 | Puck                       | 58 673 82 81   | drewno@zdramet.pl              |
| SYLBUD S.Ciechiewicz                 | Teresin 14                        | 86-014 | Siczenko                   | 601-650-801    | sylbud@o2.pl                   |
| SZUWAŁA WIĄZARY                      | ul. Bydgoska 48                   | 86-050 | Solec Kujawski             | 602 665 634    | biuro@szuwalawiazary.pl        |
| SETLER                               | ul. Wiśłana 35                    | 87-125 | Silno                      | 509 041 383    | konstrukcje@setler.pl          |
| Ecoplan                              | ul. Mostki 2a                     | 87-815 | Smólnik                    | 605 852 233    | ecoplan@op.pl                  |
| Bracia Wiland                        | Kierzkowo 12A                     | 88-403 | Jadowniki Rycerskie        | 604456374      | biuro@wiland.pl                |
| WPPW INVEST                          | ul. Tylna 4C/5                    | 90-364 | Łódź                       | 42 676 50 96   | biuro@wppwinvest.pl            |
| DREWPROJEKT                          | ul. Labentowicza 10               | 95-050 | Konstantynów Łódzki        | 887 520 440    | drewprojekt@o2.pl              |
| KD Marcinkowscy                      | Paprotnia 11a                     | 95-060 | Brzeziny                   | 696472928      | biuro@kdmarcinkowscy.pl        |
| KASMO Sp. z o.o.                     | ul. Kilńskiego 33                 | 95-200 | Pabianice                  | 533 939 493    | firma@kasma.com.pl             |
| MABUDO                               | ul. Ceramiczna 8                  | 98-220 | Zduńska Wola               | 43 823 41 41   | domy@mabudo.pl                 |
| WIĄZAR DACH                          | Nowa Wieś 54A                     | 98-275 | Brzeźno                    | 605 601 004    | wiazar.dach@gmail.com          |
| TARTAK I.W. WITKOWSCY                | Rychtowiec 21B                    | 98-300 | Wieluń                     | 43 842 86 00   | kontakt@wiazar.pl              |
| Wirex Construction                   | Biała 131 /k Pajęczna             | 98-332 | Rząśnia                    | 44 631 68 47   | construction@wirex.pl          |
| HANTVERKARPOOLEN                     | Kocierzew Południowy 104A         | 99-414 | Kocierzew Płd. k/Łowicza   | 46 837 20 12   | biuro@twojdachwojdom.com       |
| <b>BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE</b>     |                                   |        |                            |                |                                |
| Nazwa firmy                          | Ulica                             | Kod    | Miasto                     | telefon        | e-mail                         |
| LUGRO Wiązary Dachowe                | ul. Mazowiecka 11                 | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki       | 510 510 417    | biuro@fabryka-domow.pl         |
| N-DREWNO                             | ul. Lubelska 9/7                  | 24-300 | Opole Lubelskie            | 783542565      | lublin@ndrewno.pl              |
| Scan Dach Sp. z o.o.                 | ul. Fatimska 41A/310              | 31-831 | Kraków                     | 508 730 766    | slawomir@scandach.pl           |
| WIĄZAR-SYSTEM o/Śląsk                | ul. Strzelców Bytomskich 87B      | 41-914 | Bytom                      | 530 308 513    | slask@wiazar-system.pl         |
| WIĄZAR-SYSTEM o/Wrocław              | ul. Koberzycka 10 3 piętro        | 52-315 | Wrocław                    | 530 303 477    | m.lwaniak@wiazar-system.pl     |
| GRUPA BURKIEWICZ SP.J.               | ul. Wincentego Pola 10            | 58-500 | Jelenia Góra               | 609 408 408    | m.myrlak@burkiewicz.pl         |
| INTER-LERS o/Poznań                  | ul. Kopanina 28/32 pok. 110       | 60-105 | Poznań                     | 72 888 83 53   | poznan@inter-lers.pl           |
| ROMAR o/Poznań                       | ul. Marcelińska 100/87            | 60-324 | Poznań                     | 61 226 82 22   | wycena@pphu-roma.pl            |
| DREWPROJEKT o/Poznań                 | ul. Starołęcka 18A, lok.303       | 61-361 | Poznań                     | 536 963 400    | drewprojekt.poznan@o2.pl       |
| WIĄZARY BURKIEWICZ                   | ul. 5 stycznia 2b/1               | 64-200 | Wolsztyn                   | 68 384 27 20   | a.przadka@burkiewicz.pl        |
| WIĄZAR-SYSTEM o/Lubuskie             | ul. Przemysłowa 20                | 67-300 | Wieliczce                  | 530 152 001    | k.lindmajer@wiazar-system.pl   |
| WIĄZARY SZUWAŁA o/Pomorze            | ul. Gdańska 1A                    | 83-304 | Przedkowo                  | 666 377 388    | konstruktor@szuwalawiazary.pl  |
| INTER-LERS o/Bydgoszcz               | ul. Wojska Polskiego 8            | 85-171 | Bydgoszcz                  | 52 320 29 23   | bydgoszcz@inter-lers.pl        |
| DREWPROJEKT o/Łódź                   | ul. T. Kościuszki 59/61 lok. 608  | 90-514 | Łódź                       | 577-748-728    | drewprojekt.lodz@o2.pl         |
| WIĄZAR DACH o/Łódź                   | ul. Rokicińska 132 (1-sze piętro) | 95-020 | Andrespol k/Łodzi          | 693 549 337    | wiazar.dach.lodz@gmail.com     |
| WIĄZARY CZAPLICKI o/Łowicz           | ul. Łódzka 69                     | 99-400 | Łowicz                     | 721 136 024    | ambud.konstrukcje@gmail.com    |

**UWAGA: Zmiana płytek kolczastych Mitek (GNA20, T150, GN14, M14), na płytki innych producentów, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)**
